

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2022**




**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE DE 2022**

**1. OBJETIVO**


El objetivo del FCP Valor Forestal es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a largo plazo cuya política se centra en el desarrollo de plantaciones de Caucho Natural ubicadas entre los Municipios de Santa Rosalía y La Primavera en el Departamento del Vichada desarrollando toda la cadena productiva -desde la adquisición de tierras, maquinaria y equipos, pasando por las etapas de germinación y vivero (incluyendo jardín clonal para la obtención de la muestra genética de los árboles utilizados en la plantación), establecimiento, sostenimiento, producción y aprovechamiento forestal, etapa que se extiende hasta el fin de la vida útil de cada compartimento.

El compartimento 8 (Santa María), cuenta con un área de 773,94 Ha establecidas. Actualmente los bloques corresponden en un 100% a inmaduros (en sostenimiento).

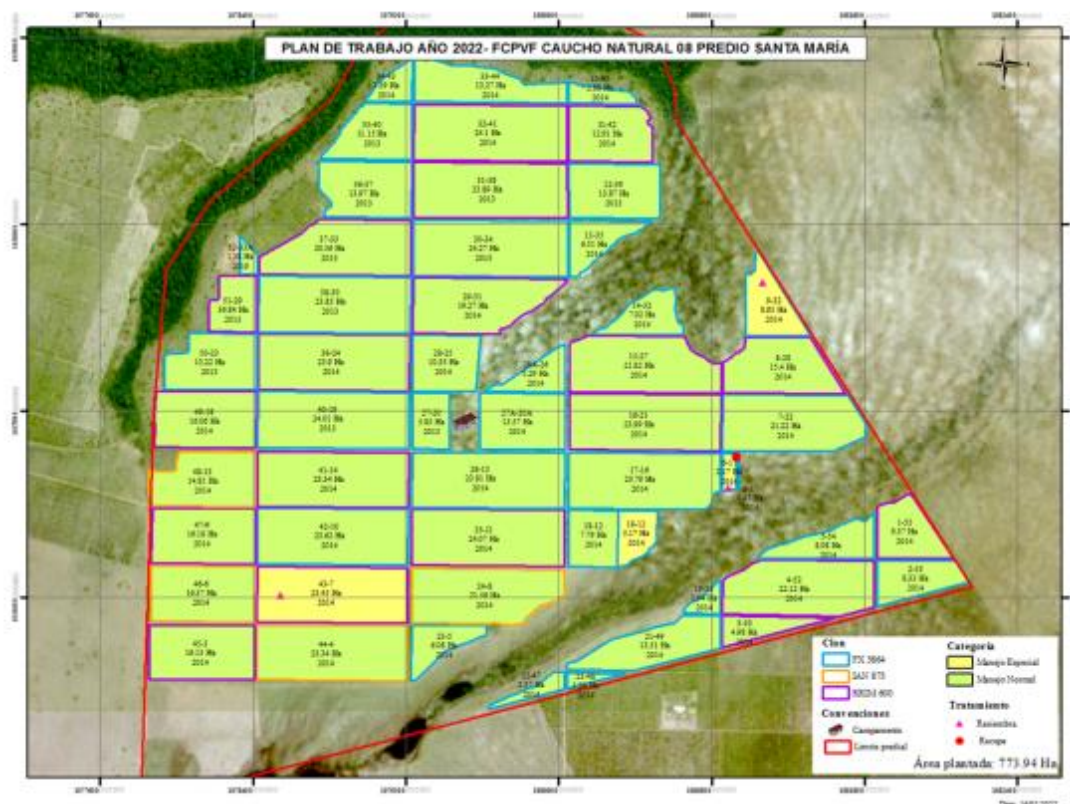

## 2. INDICADORES DE GESTION PLANTACIÓN

El seguimiento general a las actividades desarrolladas en plantación se da por medio del seguimiento de Indicadores de cada labor en cada uno de los compartimentos.

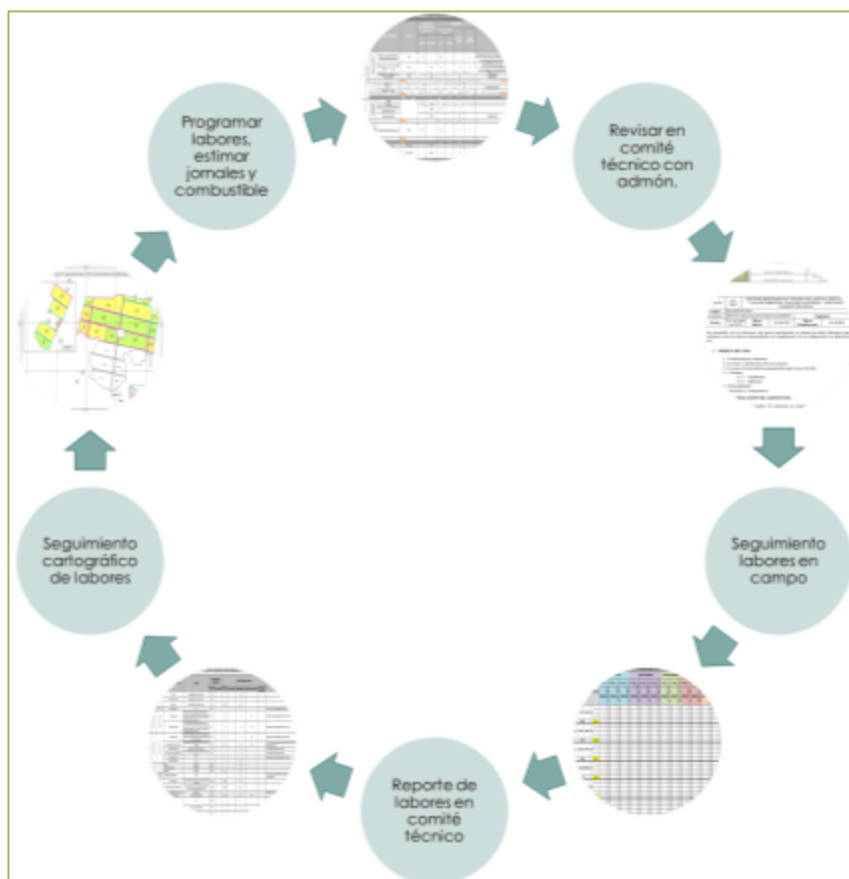

Los primeros de cada mes se realiza un comité técnico con asistencia del asesor de Caucho, Gerencia de Fondos, Ingeniera Ambiental, Gerencia Financiera, director de Plantación, asistente Administrativa de Plantación y equipo técnico al frente de cada compartimento con el objetivo de revisar las actividades realizadas el mes anterior y verificar los indicadores de gestión en cada una de las actividades de cada compartimento. Adicional, se realiza la programación de actividades a desarrollar en el mes que inicia.

Los 16 de cada mes se lleva a cabo otro comité técnico que cuenta con los mismos asistentes, para revisar los avances de la programación del mes, determinar necesidades adicionales y definir la ejecución de un plan de choque de acuerdo con los recursos existentes y enfocados en el cumplimiento de los objetivos propuestos.



NACOBENA  
Asset Management

### Tabla Ejemplo de indicadores y medición.

*Cronograma actividades 2022*

| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES - Campesinatos II                |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |
|------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|---|---|-------|---|---|---|--------|---|---|---|------------|---|---|---|---------|---|---|---|-----------|--------|--------|--------|-----------|------|--|--|------------------------------|-------------------------|---|
| Año 2022                                                   |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |
| Cronograma de Actividades<br>Situacionales del campesinato | Enero  |       |        |        | Febrero |        |        |        | Marzo  |        |        |        | Abril   |   |   |   | Mayo |   |   |   | Junio |   |   |   | Julio |   |   |   | Agosto |   |   |   | Septiembre |   |   |   | Octubre |   |   |   | Noviembre |        |        |        | Diciembre |      |  |  | % Cumplimiento 3er Trimestre |                         |   |
|                                                            |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  | Año<br>programado<br>(%)     | Año<br>ejecutado<br>(%) | % |
|                                                            | 1      | 2     | 3      | 4      | 1       | 2      | 3      | 4      | 1      | 2      | 3      | 4      | 1       | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 1      | 2 | 3 | 4 | 1          | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |
| Control mecánico de malezas                                | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           | 163.03 | 163.03 | 100%   |           |      |  |  |                              |                         |   |
| Control químico de malezas                                 | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | 431.77 | 508.26    | 118% |  |  |                              |                         |   |
| Control manual de malezas                                  | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | 148.06 | 156.06    | 105% |  |  |                              |                         |   |
| Control fitosanitario                                      | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | 64.74  | 64.74     | 100% |  |  |                              |                         |   |
| Fertilización edáfica                                      | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | 774.98 | 907.3     | 60%  |  |  |                              |                         |   |
| Control de hembra anisra                                   | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Pasadas de monitoreo                                       | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Mantenimiento de vías                                      | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Mantenimiento de puentes                                   | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Bareras contra incendio                                    | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | 774.98 | 774.98    | 100% |  |  |                              |                         |   |
| Control sobre vegetación<br>circundante                    | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Vigilancia, monitoreo, prevención de<br>incendios          | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Actividades ambientales                                    | F      | ---   | ---    | ---    |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        | -      | -         | -    |  |  |                              |                         |   |
| Comparativo pluviométrico                                  |        |       |        |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |
| Precipitación media mensual est.<br>Gaviotas               | 100.53 | 47.45 | 55.44  | 128.34 | 331.30  | 381.32 | 417.27 | 354.59 | 284.05 | 285.15 | 253.54 | 220.44 | 2841.70 |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |
| Precipitación mensual del<br>campesinatos, Ito, II         | 0.00   | 94.00 | 130.30 | 245.00 | 458.00  | 315.00 | 494.15 | 385.10 | 248.90 | 353.00 | 208.20 | 18.30  | 3106.75 |   |   |   |      |   |   |   |       |   |   |   |       |   |   |   |        |   |   |   |            |   |   |   |         |   |   |   |           |        |        |        |           |      |  |  |                              |                         |   |

## **PRIMER SEMESTRE**

### **3.1 Plan Preventivo para Detección de Incendios**

La primera actividad reportada es la relacionada con el control de incendios de la plantación, actividad que se hace de manera preventiva para evitar este tipo de catastrofes en los compartimentos.

Esta actividad comprende:

- Rutas de monitoreo de linderos del compartimento y su respectivo recorrido constante hasta culminación de época seca en la región.
- Plan de reacción en caso de ocurrencia de incendios para evitar su propagación.
- Realización de rondas corta-fuego en los linderos del compartimento.
- Identificación y manejo correcto de equipos, a saber:
  - Tractor
  - Rastra
  - Bombas de espalda
  - Bate-fuegos
  - Palas
  - Remolque con tanque para depósito de agua

Con lo anterior, se da cumplimiento a los protocolos de seguridad diseñados para localizar, prevenir y contrarrestar incendios dentro y fuera de la plantación. Finalizando la época seca del periodo 2021-2022 no se presentó ningún incidente relacionado con incendios en la plantación.



### **3.2 Control de Malezas**

- **Control Mecánico de Malezas**

Corresponde al control realizado sobre las calles de cada uno de los bloques que se detallan en cada trimestre. En esta actividad se llevó a cabo la erradicación de plantas no benéficas para el cultivo de caucho con maquinaria agrícola. Durante el primer trimestre, la actividad fue realizada en 204.45 Ha de la plantación.

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| Bloque                           | Has   | % Control |
|----------------------------------|-------|-----------|
| 36-37                            | 13.97 | 100%      |
| 35-40                            | 11.15 | 100%      |
| 34-43                            | 3.39  | 100%      |
| 33-44                            | 13.27 | 100%      |
| 32-41                            | 24.1  | 100%      |
| 31-38                            | 23.89 | 100%      |
| 30-34                            | 24.27 | 100%      |
| 29-31                            | 19.27 | 100%      |
| 28-25                            | 10.35 | 100%      |
| 27-20                            | 5.85  | 100%      |
| 27 <sup>a</sup> -20 <sup>a</sup> | 13.57 | 100%      |
| 28 <sup>a</sup> -26              | 5.29  | 100%      |

| Bloque | Has   | % Control |
|--------|-------|-----------|
| 13-35  | 6.51  | 100%      |
| 12-39  | 13.87 | 100%      |
| 11-42  | 12.91 | 100%      |
| 10-45  | 2.88  | 100%      |
| 13-35  | 6.51  | 100%      |




Durante el segundo trimestre la actividad se programaron 271.8 Ha, las cuales fueron completadas al 100%. La siguiente tabla especifica los bloques en los cuales se realizó la actividad.

| Bloques | Área (Ha) | % De Control |
|---------|-----------|--------------|
| 8-28    | 15.4      | 100          |
| 7-22    | 21.22     | 100          |
| 6-17    | 2.17      | 100          |
| 18-12   | 12.96     | 100          |
| 25-11   | 24.07     | 100          |
| 26-15   | 23.68     | 100          |
| 9-32    | 8.65      | 100          |
| 14-32   | 7.02      | 100          |
| 15-27   | 21.82     | 100          |
| 16-21   | 23.99     | 100          |
| 17-16   | 23.79     | 100          |
| 41-14   | 23.62     | 100          |
| 42-10   | 23.34     | 100          |
| 40-19   | 24.01     | 100          |
| 49-18   | 16.06     | 100          |



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**

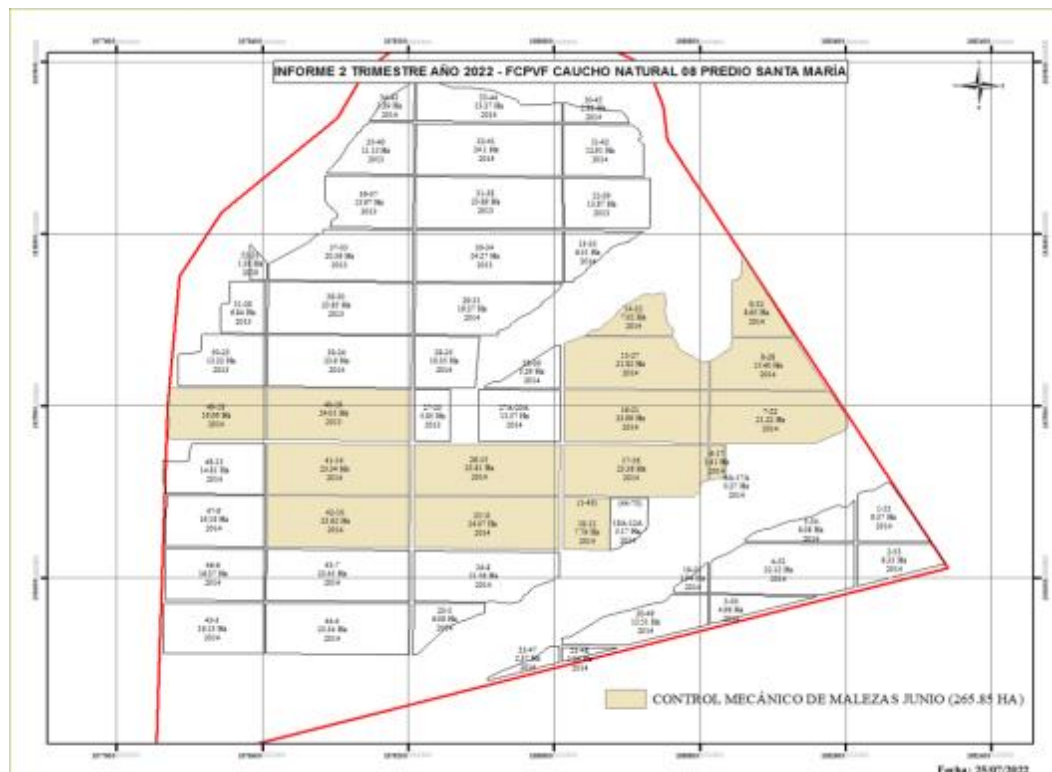

- Control Manual de Malezas**

Corresponde al control de malezas sobre los surcos en los que se encuentran los árboles de caucho, actividad realizada por medio de auxiliares de campo con machete y/o palín en zonas donde se requiera para evitar la competencia de nutrientes con los árboles de caucho.

Se reporta durante el primer trimestre del año, la ejecución de la actividad en un total de 72.77 Ha lo cual equivale a un 9.4% del total de las áreas del compartimento.



| BLOQUES | Has   | % CONTROL |
|---------|-------|-----------|
| 39.24   | 23.9  | 100%      |
| 37.33   | 20.36 | 100%      |
| 36.37   | 13.97 | 100%      |
| 35.40   | 11.15 | 100%      |
| 34.43   | 3.39  | 100%      |
| 39.24   | 23.9  | 100%      |

### 3.3 Fertilización

Por medio del registro fotográfico se evidencia la dificultad que se ha presentado para el transporte del fertilizante hasta la plantación. Este año se han presentado niveles de precipitación más fuertes de lo normal, volviendo las vías muy complejas de transitar; esto ha dificultado el ingreso del insumo, sin embargo la mayoría de éste se encuentra ya en plantación.



Posteriormente al ingreso, se procede a realizar el descargue del fertilizante.

Se recibió el fertilizante que llegó a plantación en el campamento principal y se ubicó en las bodegas designadas para su almacenamiento. Este fue colocado sobre las estibas fabricadas previo a la llegada para evitar que el producto se deteriore. Una vez recibido, se procedió al conteo del insumo y repartición del mismo.



Para el Compartimento 8 se definió la compra de 37 Ton de Fertilizante NPK para ser aplicados en todas las hectáreas.

### 3.4 Control Fitosanitario Y Plagas

- Gusano Cachón**

Esta actividad fue realizada en 196.96 hectáreas de la plantación las cuales representan el 25.4% del total de hectáreas establecidas. Esta actividad se realizó en el primer trimestre del año, con el fin de evitar daños foliares en el activo biológico.

| Bloques | Has   | Afectación | % Control |
|---------|-------|------------|-----------|
| 40.19   | 4     | 10%        | 100%      |
| 16.21   | 3     | 10%        | 100%      |
| 8.28    | 15.4  | 25%        | 100%      |
| 48.13   | 14.81 | 35%        | 100%      |
| 46.6    | 16.37 | 80%        | 100%      |
| 44.4    | 23.34 | 30%        | 100%      |
| Bloques | Has   | Afectación | % Control |
| 43.7    | 23.45 | 50%        | 100%      |
| 42.10   | 23.62 | 50%        | 100%      |
| 25.11   | 24.07 | 33%        | 100%      |
| 24.8    | 21.56 | 28%        | 100%      |
| 41.14   | 23.34 | 40%        | 100%      |
| 49.18   | 4     | 10%        | 100%      |



- Hormiga Arriera**

Se llevó a cabo el control de la hormiga arriera en los bloques descritos en la tabla. Este control es necesario ya que los bachaqueros dificultan las labores de control mecánico. Durante el primer trimestre del año se realizó el control de hormiga arriera, reportando un avance del 56.62 Ha que representan el 7.3% de la plantación.

| BLOQUES | Has   | % CONTROL |
|---------|-------|-----------|
| 47-9    | 16.18 | 100%      |
| 46-60   | 16.37 | 100%      |
| 25-11   | 24.07 | 100%      |



## SEGUNDO SEMESTRE

### 3.5 Control de plagas

Durante el mes de diciembre se realizó la actividad en **64,74 Ha** del compartimento. Los bloques se especifican a continuación.



| CONTROL DE PLAGAS (COMEJÉN) |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| BLOQUE                      | ÁREA (HA) | % CONTROL |
| 45-3                        | 16,13     | 100       |
| 46-6                        | 16,37     | 100       |
| 47-9                        | 16,18     | 100       |
| 49-18                       | 16,06     | 100       |

### 3.6 Control de malezas


- Control manual de malezas**

En el mes de agosto la actividad se ejecutó en 155,24 Ha de la plantación, los bloques intervenidos requerían de esta actividad con urgencia debido a alta presencia de malezas.


**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| Control Manual |           |              |
|----------------|-----------|--------------|
| Bloque         | Área (Ha) | % De Control |
| 13-35          | 6,51      | 100%         |
| 12-39          | 13,86     | 100%         |
| 29-31          | 19,27     | 100%         |
| 31-38          | 23,88     | 100%         |
| 32-41          | 24,00     | 100%         |
| 10-45          | 2,88      | 100%         |
| 11-42          | 12,91     | 100%         |
| 27-20          | 5,85      | 100%         |
| 15-27          | 21,81     | 100%         |
| 30-34          | 24,27     | 100%         |

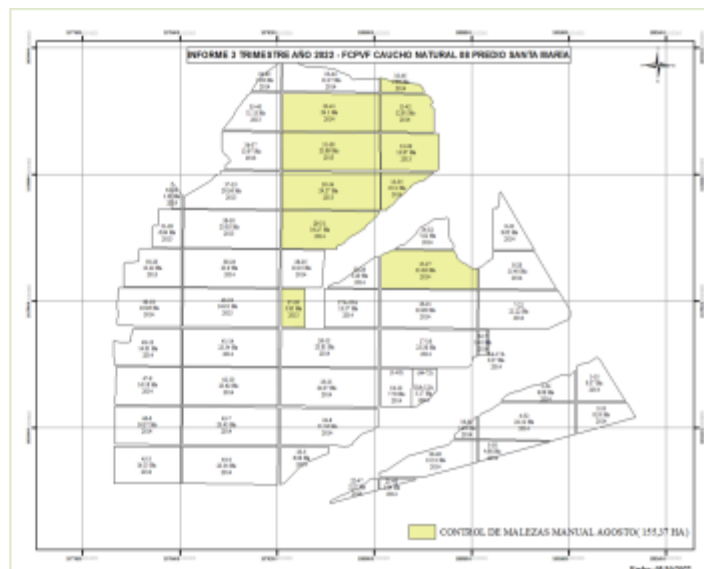

En el mes de octubre se controlaron 67,62 Ha del compartimento, y en el mes de noviembre 87,92 Ha como se muestra a continuación:

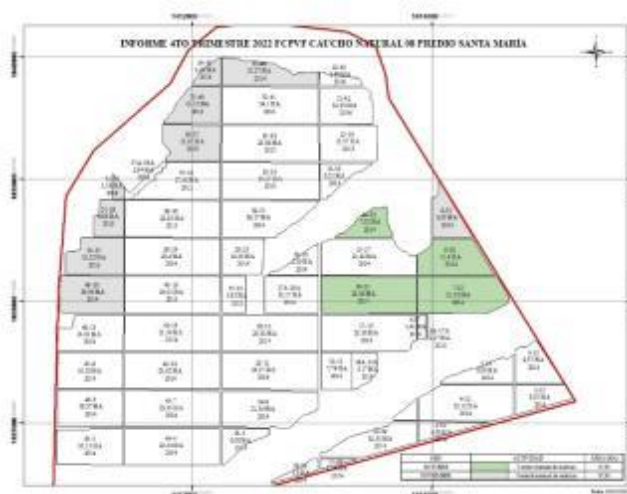

| MES       | CONTROL MANUAL |           |           |
|-----------|----------------|-----------|-----------|
|           | BLOQUE         | ÁREA (HA) | % CONTROL |
| OCTUBRE   | 7-22           | 21,22     | 100       |
|           | 8-28           | 15,40     | 100       |
|           | 14-32          | 7,02      | 100       |
|           | 16-21          | 23,99     | 100       |
| NOVIEMBRE | 9-32           | 8,65      | 100       |
|           | 33-44          | 13,27     | 100       |
|           | 34-43          | 3,39      | 100       |
|           | 35-40          | 11,15     | 100       |
|           | 36-37          | 13,97     | 100       |
|           | 49-18          | 16,06     | 100       |
|           | 50-23          | 13,22     | 100       |
|           | 51-29          | 6,84      | 100       |
|           | 52-33          | 1,38      | 100       |


- **Control Mecánico**

Entre los meses de julio, agosto y septiembre se realizó la actividad en 316,51 Ha del compartimento. Las áreas escogidas fueron aquella que requerían la actividad con mayor urgencia. Los bloques se especifican en la siguiente tabla.

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| Bloque | Área (Ha) | % De Control |
|--------|-----------|--------------|
| 47-9   | 16,18     | 100%         |
| 43-7   | 23,45     | 100%         |
| 24-8   | 21,55     | 100%         |
| 23-5   | 6,08      | 100%         |
| 46-6   | 16,37     | 100%         |
| 44-4   | 23,33     | 100%         |
| 48-13  | 14,81     | 100%         |
| 50-23  | 13,21     | 100%         |
| 51-29  | 5,46      | 100%         |
| 52-33  | 1,38      | 100%         |
| 28-26  | 5,28      | 100%         |
| 10-45  | 2,88      | 100%         |
| 11-42  | 12,91     | 100%         |
| 12-39  | 13,86     | 100%         |
| 13-35  | 6,51      | 100%         |
| 39-24  | 23,89     | 100%         |
| 38-30  | 23,84     | 100%         |
| 37-33  | 20,35     | 100%         |
| 1-55   | 9,36      | 100%         |
| 2-53   | 8,36      | 100%         |
| 3-50   | 4,98      | 100%         |
| 4-52   | 22,11     | 100%         |
| 5-54   | 8,07      | 100%         |
| 19-51  | 1,94      | 100%         |
| 20-49  | 13,77     | 100%         |
| 21-48  | 1,23      | 100%         |
| 22-47  | 1,34      | 100%         |
| 45-3   | 16,12     | 100%         |

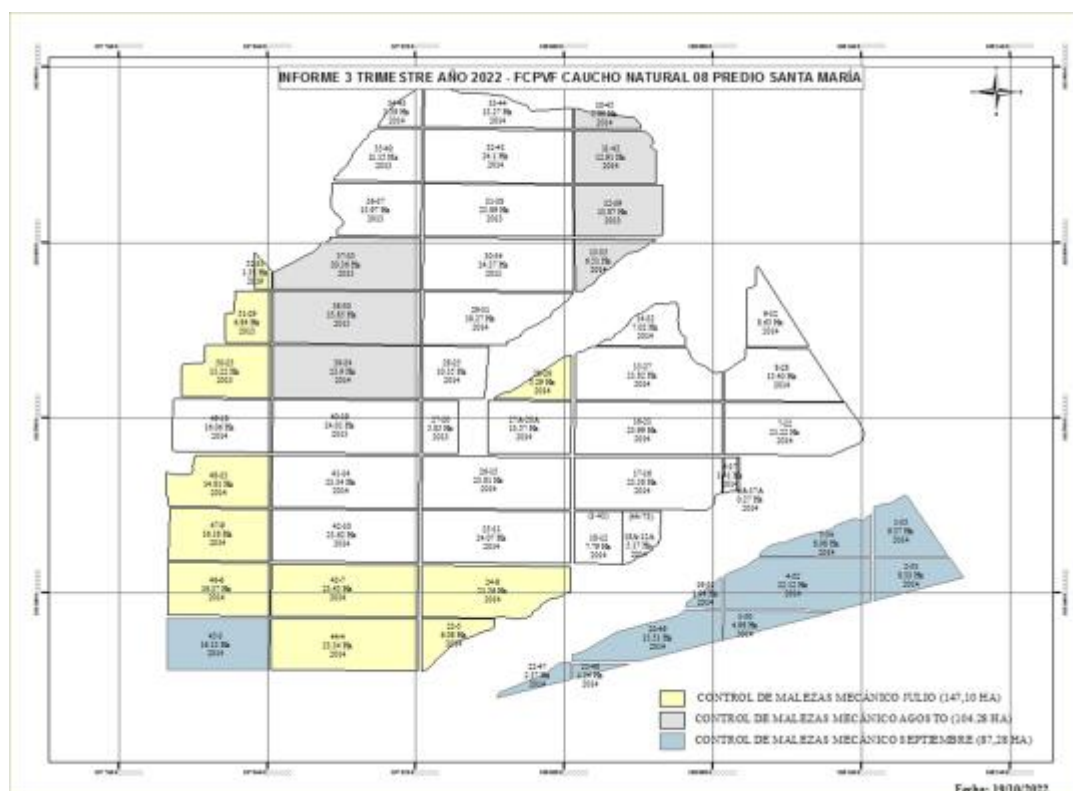

En el mes de noviembre se controlaron **163,06 Ha** del compartimento, como se muestra a continuación:

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| MES       | CONTROL MECÁNICO DE MALEZAS |           |           |
|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|
|           | BLOQUE                      | ÁREA (HA) | % CONTROL |
| NOVIEMBRE | 27-20                       | 5,85      | 100       |
|           | 27A-20A                     | 13,57     | 100       |
|           | 28-25                       | 10,35     | 100       |
|           | 29-31                       | 19,27     | 100       |
|           | 30-34                       | 24,27     | 100       |
|           | 31-38                       | 23,89     | 100       |
|           | 32-41                       | 24,10     | 100       |
|           | 33-44                       | 13,27     | 100       |
|           | 34-43                       | 3,39      | 100       |
|           | 35-40                       | 11,15     | 100       |
|           | 36-37                       | 13,97     | 100       |


- Control Químico**

En agosto y septiembre se ejecutó la labor en un total de 204,17 Ha del compartimento. La actividad era necesaria para erradicar la alta presencia de malezas invasivas alrededor del surco de los arboles. Los bloques se especifican en la siguiente tabla.

| Control Químico |           |              |
|-----------------|-----------|--------------|
| Bloque          | Área (Ha) | % De Control |
| 32-41           | 24,00     | 100%         |
| 31-38           | 23,88     | 100%         |
| 30-34           | 24,27     | 100%         |
| 12-39           | 13,86     | 100%         |
| 13-35           | 6,51      | 100%         |
| 28-25           | 10,34     | 100%         |
| 33-44           | 13,26     | 100%         |
| 34-43           | 3,38      | 100%         |
| 35-40           | 11,14     | 100%         |
| 36-37           | 13,96     | 100%         |
| 14-32           | 7,01      | 100%         |
| 10-45           | 2,88      | 100%         |
| 11-42           | 12,91     | 100%         |
| 29-31           | 19,27     | 100%         |
| 15-27           | 17,5      | 80,24%       |



**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2022**

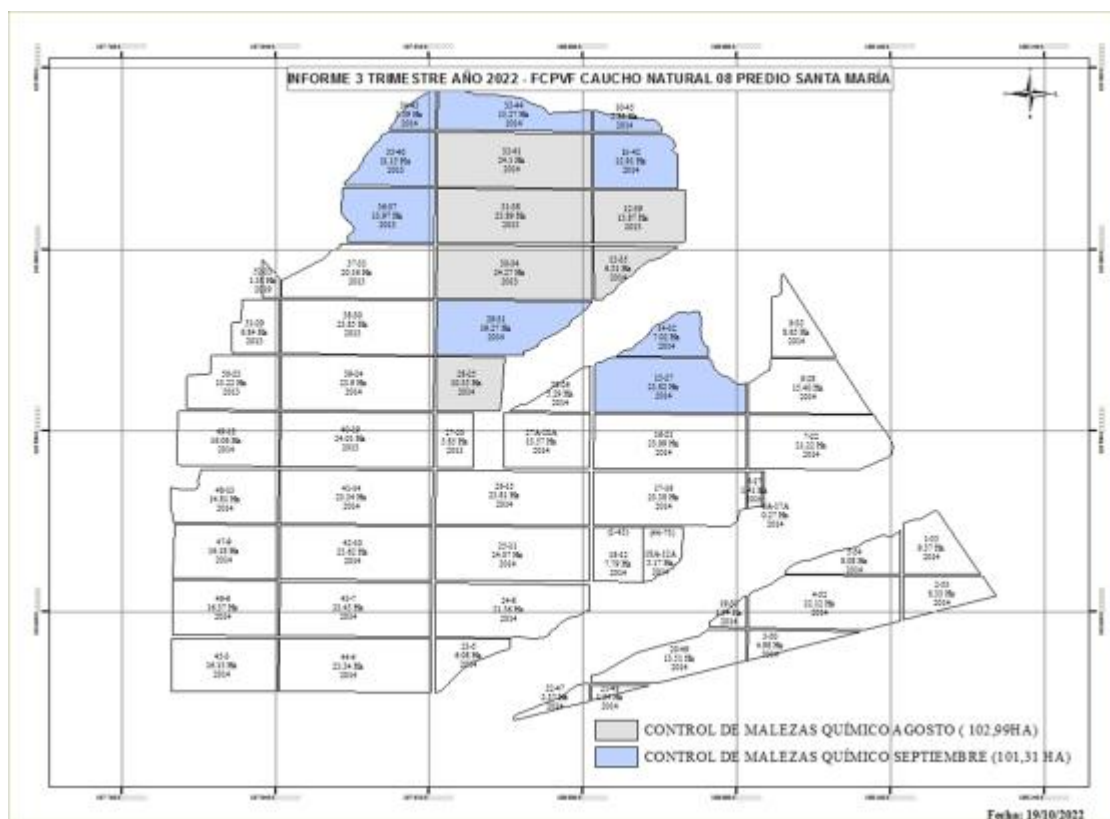


En el mes de octubre se controlaron **508,26 Ha** del compartimento y en el mes de noviembre **76,6 Ha** como se muestra a continuación:

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| MES     | CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS |           |           |
|---------|----------------------------|-----------|-----------|
|         | BLOQUE                     | ÁREA (HA) | % CONTROL |
| OCTUBRE | 3-50                       | 4,98      | 100       |
|         | 4-52                       | 22,12     | 100       |
|         | 5-54                       | 8,08      | 100       |
|         | 8-28                       | 15,40     | 100       |
|         | 9-32                       | 8,65      | 100       |
|         | 15-27                      | 21,82     | 100       |
|         | 16-21                      | 23,99     | 100       |
|         | 19-51                      | 1,94      | 100       |
|         | 20-49                      | 13,51     | 100       |
|         | 21-48                      | 1,24      | 100       |
|         | 22-47                      | 2,37      | 100       |
|         | 23-5                       | 6,08      | 100       |
|         | 24-8                       | 21,56     | 100       |
|         | 25-11                      | 24,07     | 100       |
|         | 26-15                      | 23,81     | 100       |
|         | 27-20                      | 5,85      | 100       |
|         | 27A-20A                    | 13,57     | 100       |
|         | 28-26                      | 5,29      | 100       |
|         | 37-33                      | 17,42     | 100       |
|         | 38-30                      | 23,85     | 100       |
|         | 39-24                      | 23,90     | 100       |
|         | 40-19                      | 24,01     | 100       |
|         | 41-14                      | 23,34     | 100       |
|         | 42-10                      | 23,62     | 100       |
|         | 43-7                       | 23,45     | 100       |
|         | 44-4                       | 23,34     | 100       |
|         | 45-3                       | 16,13     | 100       |
|         | 46-6                       | 16,37     | 100       |
|         | 47-9                       | 16,18     | 100       |
|         | 48-13                      | 14,81     | 100       |
|         | 49-18                      | 16,06     | 100       |
|         | 50-23                      | 13,22     | 100       |
|         | 51-29                      | 6,84      | 100       |
|         | 52-33                      | 1,38      | 100       |

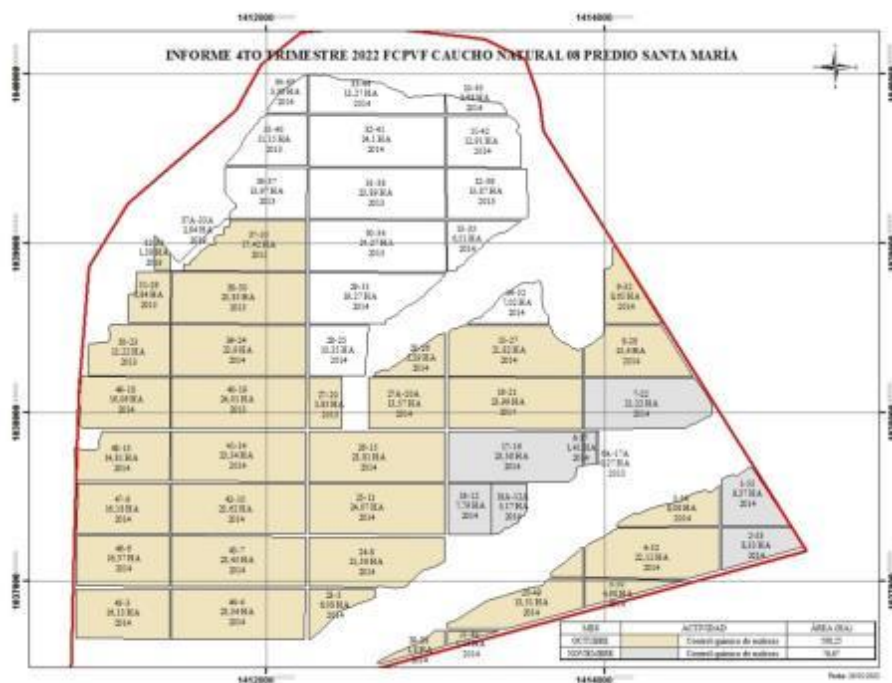


**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



| MES       | CONTROL QUÍMICO DE MALEZAS |           |           |
|-----------|----------------------------|-----------|-----------|
|           | BLOQUE                     | ÁREA (HA) | % CONTROL |
| NOVIEMBRE | 1-55                       | 9,37      | 100       |
|           | 2-53                       | 8,33      | 100       |
|           | 6-17                       | 1,41      | 100       |
|           | 7-22                       | 21,22     | 100       |
|           | 17-16                      | 23,38     | 100       |
|           | 18-12                      | 7,79      | 100       |
|           | 18A-12A                    | 5,17      | 100       |

### 3.7 Fertilización Edáfica - Aplicación

En el mes de octubre se fertilizaron **507,30 Ha** del compartimento, en los bloques que se muestran a continuación:

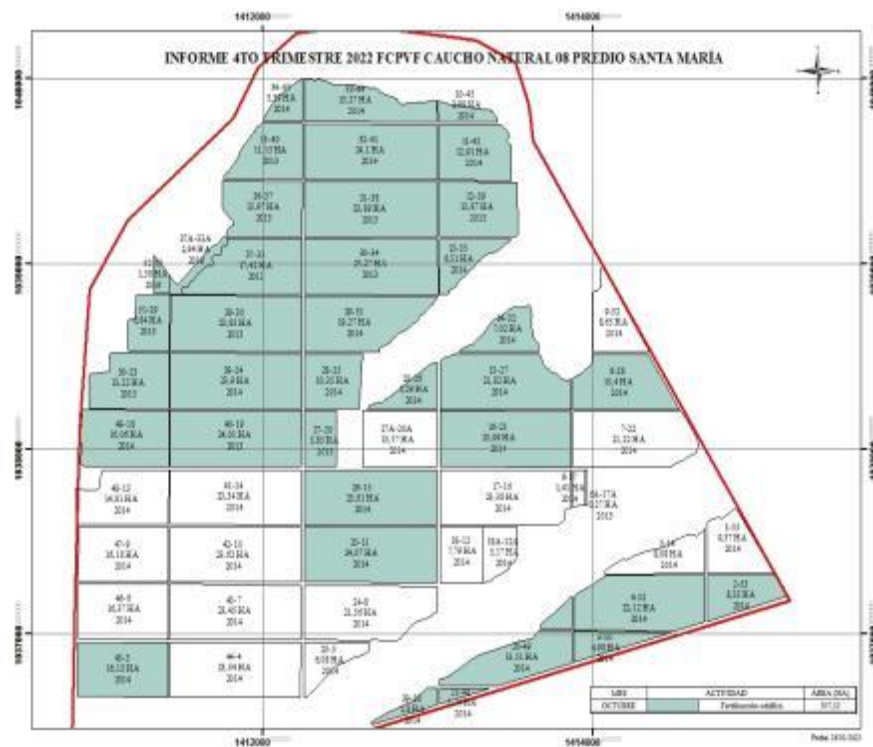

### 3.8 Mantenimiento Barreras cortafuegos

El mantenimiento se realizó en toda la barrera cortafuego que delimita el compartimento, esto con el fin de disminuir el riesgo de propagación de incendios en la plantación.



### **3.9 Visita Asesor banco Davivienda**

El equipo del gestor realizó el respectivo acompañamiento y orientación al asesor del Banco DAVIVIENDA, quien visitó la plantación para llevar a cabo las verificaciones necesarias.



### **3.10 Censo Forestal**

En el mes de noviembre el equipo administrativo de Bogotá se desplazó a la plantación para realizar la actividad junto con el equipo técnico y auxiliares de campo.



### **3.11 Fiesta Fin De Año**

El 25 de Noviembre, a partir de las 2:00 pm, se realizó la fiesta de fin de año de la plantación, a la que asistieron los empleados y sus familias, y los vecinos de las fincas aledañas. Durante la fiesta, los protagonistas fueron los hijos de los empleados, los cuales recibieron regalos que fueron proporcionados por el proveedor del fertilizante MIP, quien se unió a la celebración apoyando la infancia y el futuro de nuestro país y así otorgarles una digna celebración para clausurar el año 2022.




### **3.12 Brigada Médica En Plantación**

El personal médico del hospital del municipio de Santa Rosalía realizó una jornada de atención primaria en salud para el personal de la plantación, esta fue llevada a cabo en las instalaciones del Compartimento Caucho 3. Durante la jornada, el personal de la plantación recibió orientación médica general y odontológica, fueron remitidos a especialistas, y se les hizo entrega de medicamentos necesarios.



### 3.13 Gusano Cachón 2023

Se han identificaron focos de gusano cachón en 10 bloques de la plantación, con ataques leves gracias al estado de maduras de las hojas refoliadas y la poca densidad de larvas. Actualmente el bloque 43-7 presenta ataques foliares por larvas de gusano cachón que requieren aplicación química de forma rápida. En los demás bloques se identifican larvas en estado de pupas, por lo que se requiere de actividades de monitoreo, recolección manual e instalación de trampas, con el fin de cortar el ciclo reproductivo dentro de la plantación. Se programa el control del gusano cachón en los bloques afectados en el mes de febrero:

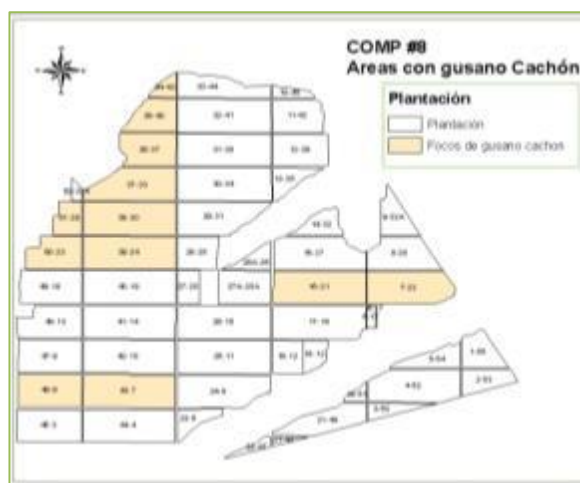

| Bloque       | Área total    |
|--------------|---------------|
| 16-21        | 23,98         |
| 37-33        | 20,35         |
| 39-24        | 23,89         |
| 51-29        | 6,84          |
| 7-22         | 21,21         |
| 35-40        | 11,14         |
| 36-37        | 14,0          |
| 38-30        | 23,84         |
| 43-7         | 23,45         |
| 46-6         | 16,37         |
| 50-23        | 13,21         |
| <b>Total</b> | <b>198,24</b> |

#### **4. INFORME AMBIENTAL**

##### **PRIMER SEMESTRE**

##### **4.1. Trampas de Grasa**

Esta actividad se realiza para dar cumplimiento con los requisitos ambientales que se tienen como empresa agrícola constituida. Adicionalmente, estas actividades son un requisito impuesto por Corporinoquia, entidad que hace visitas de control de manera frecuente.

Se realizó el mantenimiento a las trampas grasas que hay en el campamento. A su vez, se realizó el respectivo pesaje de basuras y acopio de estas en la zona destinada. Se llevó a cabo el mantenimiento de los puntos ecológicos y la debida capacitación ambiental liderada para la ingeniera encargada. Los técnicos encargados también realizan las debidas capacitaciones al personal de la planta, todo con el fin de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente.



##### **4.2. Visita Corporinoquia**

El 21 de junio funcionarios de CORPORINOQUÍA realizaron la visita de control y seguimiento ambiental al predio Santa María.

Se validó el cumplimiento a las Medidas de Manejo Ambiental establecidas en la Resolución 600.36.19.0054 del 24 de octubre de 2019.


- Revisión concesión de aguas subterráneas.
- Supervisión aparatos de medición de caudal.
- Conservación ronda protectora de franja de bosque.
- Revisión uso permiso de vertimientos de Aguas Residuales Domésticas- ARD.
- Manejo y disposición de Residuos Sólidos Domésticos- RSD.



## **SEGUNDO SEMESTRE**

### **4.3. Precipitación**

Adicional, se presenta la información de precipitación en cada uno de los campamentos donde se toma el registro correspondiente.

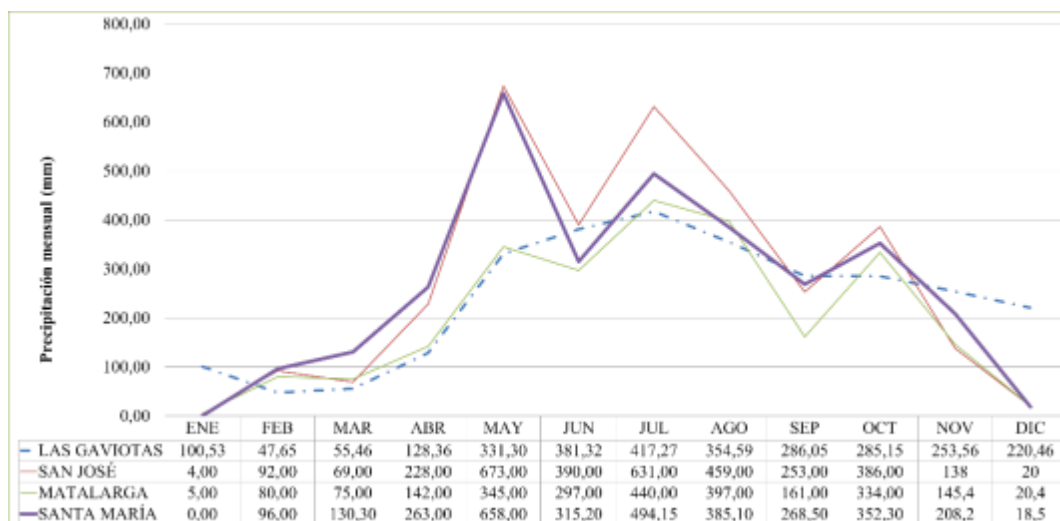

Los datos de “La Gaviota” son los registros históricos de la estación de referencia, y el Campamento del Compartimento 8 corresponde a Santa María.

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL  
COMPARTIMENTO 8  
SEGUNDO SEMESTRE 2022**



#### 4.4. Disposición final de residuos solidos

En el mes de diciembre se realizó la gestión, transporte y disposición final de 500 kg de residuos sólidos ordinarios almacenados temporalmente en el campamento Santa María, esto con el fin de dar cumplimiento a una de las Medidas de Manejo Ambiental establecidas en la Resolución de CORPORINOQUÍA No. 600.36.19.0054 del 2019.



#### 4.5. Tasa por Uso de Agua

Entre el mes de agosto y septiembre se realizó la solicitud y pago de la tasa por uso del agua del pozo profundo del predio Santa María, correspondiente al primer semestre del año 2021, quedando al día en el estado de cartera con la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUÍA-CORPORINOQUÍA.

## **5. INFORME DEL COMITÉ DE INVERSIONES DEL FCP VALOR FORESTAL**

### **PRIMER SEMESTRE**

El comité de inversiones, en cumplimiento con lo establecido en el reglamento del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, se reunió **el 25 de abril de 2022 y el 15 de julio de 2022** para revisar los temas relacionados con cada uno de los Compartimentos del Fondo. Como resultado, se generaron las actas pertinentes (Acta No. 058 y Acta No. 059 respectivamente).

#### **5.1. Extracto Acta No. 058**

En Bogotá, siendo las 02:00 pm del día 25 de abril del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma Zoom, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- Del 18 al 29 de enero del 2022 viajaron el asesor de Caucho Ing. Carlos Pérez, el Director de Banca de Inversión Sebastián Roa y la Gerente de los Fondos Forestales Carolina Herrera a plantación para revisar con todo el equipo técnico los censos de cada compartimento y realizar los planes de trabajo a presentar en la asamblea.
- Contratación del nuevo Director de Plantación (Jorge Lozano) por presentación de renuncia del anterior Director. Se realiza empalme, entrega de cargo y verificación de temas que se venían desarrollando con anterioridad.
- Adelanto de cotizaciones de fertilizantes en febrero de 2022 de acuerdo con información de censos y en preparación de los planes de trabajo programando compra en marzo e inicios de abril con el fin de ingresar el fertilizante durante la época seca. Se reporta igualmente que por el factor climático tal programación se vio interrumpida por un inicio temprano de lluvias con alta intensidad. Igualmente se reporta que, resultado de paros nacionales, los problemas a nivel internacional por la guerra entre Rusia y Ucrania y otros aspectos de limitación de insumos, se presenta un sobre costo y escases de insumos agrícolas a nivel mundial.
- Reporte de visita por parte del Sr. Rodrigo Mayorga, la Sra. Carolina Herrera y el Sr. Carlos Pérez a Yumbo en Valle del Cauca para garantizar tener el producto principal en plantación. Esta se realizó a la planta MIP, empresa colombiana que produce insumos agrícolas y con los cuáles se estableció un producto NPK especial para cada compartimento teniendo en cuenta el estudio de suelos de cada uno, realizado en enero. Lo anterior con el fin de estabilizar los suelos y aportar el faltante de mejores al NPK para atender dos frentes: suelos y el activo biológico.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde enero de 2022 hasta marzo de 2022.

- **Valoración Abril 2022**

Presentación de solicitud de ajuste de tasa de referencia para valoración así como respuesta por parte de la Sociedad Administradora en donde se establece no hacer ajustes a la fórmula de valoración teniendo en cuenta la respuesta negativa de dos compartimentos del fondo y buscando mantener la misma fórmula para todos los compartimentos.

Presentación de la valoración realizada con corte abril de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte marzo de 2022.

## **5.2. Extracto Acta No. 059**

En Bogotá, siendo las 10:00 am del día 15 de julio del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma Zoom, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- El 28 de abril de 2022 se reporta viaje del Gerente de Nacobena, Rodrigo Mayorga, la Gerente de los Fondos Forestales, Carolina Herrera, el Asesor de Caucho, Ing. Carlos Pérez, el área de investigación de Mercado, Pablo Jaramillo. El 29 de abril de 2022 se informa sobre la llegada de inversionistas del Compartimento 5 (Magdalena Forero, Nancy Arango y Reynaldo Jaimes) y del Compartimento 6 (Cesar Franco). La visita, propuesta por el equipo administrativo para mostrar trabajos realizados, se visitaron lugares específicos de plantación con soporte cartográfico y geo-referencial. Se reporta visita a diferentes compartimentos y campamentos, áreas de producción, campamento central y fincas aledañas. Se llevaron a cabo visitas minuciosas dentro de ciertos bloques mostrando aspectos positivos así como áreas que requieren de un mayor mantenimiento.
- Se reporta revisión de inventario de repuestos y manejo y planeación de requerimientos de maquinaria. Igualmente, una extensa revisión de los formatos “Kárdex” con los cuales se lleva el control del flujo y usos de la gasolina y ACPM.
- Se reportan actividades normales de la plantación (controles mecánicos, manuales y químicos de malezas y fertilización). Se reporta el desarrollo quincenal de los Comités Técnicos en los cuales se reúne el equipo técnico de plantación y el equipo administrativo para analizar las diferentes actividades en plantación. Lo anterior, se complementa con el formato de registro de actividades diseñado para el equipo técnico que permite llevar un control de actividades y el manejo de los bloques.
- Se reporta igualmente la implementación de indicadores de gestión con el fin de llevar un control más riguroso en plantación, buscando evitar un mal funcionamiento o errores que puedan afectar el crecimiento. Se informa la atención de respectivas visitas ambientales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía y la actualización de la cartera con la entidad.

- Información de actividades desarrolladas de rayado, recolección, pesaje y venta del coágulo a la empresa Mavalle S.A.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Se reporta el ajuste en fertilización de cada compartimento relacionado con la compra.

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde abril de 2022 hasta junio de 2022.

- **Valoración Junio 2022**

Presentación de la valoración realizada con corte junio de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte junio de 2022.

### **SEGUNDO SEMESTRE**

El comité de inversiones, en cumplimiento con lo establecido en el reglamento del Fondo de Capital Privado Valor Forestal, se reunió **el 10 de octubre de 2022 y el 19 de enero de 2023** para revisar los temas relacionados con cada uno de los Compartimentos del Fondo. Como resultado, se generaron las actas pertinentes (Acta No. 060 y Acta No. 061 respectivamente).

#### **5.3.Extracto acta No. 060**

En Bogotá, siendo las 12 m del día 10 de octubre del 2022, por medios virtuales a través de la plataforma ZOOM, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- La secretaria de hacienda de Santa Rosalía envió un requerimiento de una reunión presencial al administrador de los fondos y al gestor profesional en la cual se hablaría acerca de la verificación de pagos de impuestos y rublos relacionados correspondientes a la hacienda del municipio. El viaje mencionado debía llevarse a cabo el día 11 de Julio de 2022, pero debido a un cierre indefinido de la vía Bogotá-Villavicencio el viaje no pudo ser realizado y se debió cancelar la reunión presencial con la hacienda. La reunión fue realizada y atendida de manera virtual.
- El día 25 de julio, la Sra. Carolina Herrera viajó a la plantación para hacer el debido seguimiento y verificación de todas las actividades propias y necesarias de la plantación, y así llevar el debido control de la ejecución de las mismas.
- Debido al fuerte invierno presentado en la región, algunas vías sufrieron de importantes deterioros; Debido a esto, y con el fin de mantener la red vial de la plantación en buen

estado, durante los meses de Julio y Agosto se llevó a cabo la reparación y mantenimiento de las mismas. Adicional, se elaboraron policías acostados (adicional se señalizaron) con el fin de forzar el agua hacia los costados del camino y evitar una mayor erosión en la vía.

- Se culminó con el arreglo de la planta eléctrica principal ubicada en el compartimento 3, de igual manera, su uso se autoriza desde gerencia en las oficinas de Bogotá.
- El día 2 de septiembre parte del equipo administrativo de Bogotá conformado por el Sr. Rodrigo Mayorga, presidente de Nacobena S.A.S, la Sra. Carolina Herrera, gerente de los fondos forestales, Carlos Pérez, asesor de caucho y Camila Ducuara, ingeniera ambiental viajaron a la plantación. Se verificó la carpeta de contratos del personal, la diligencia y archivo de las actas técnicas y finalmente el estado de las áreas de compensación de los distintos compartimentos.
- A inicio del mes de septiembre, se concretó y llevó a cabo la visita del auditor de la aeronáutica civil con el fin de hacer la respectiva revisión a la pista “La Pamela” para la renovación del permiso de uso de la misma. El auditor hizo la solicitud de remover algunas canecas que se encontraban a los costados de la pista, cambiar el sentido de los letreros de señalización y pintar los mismos para poder aprobar la pista. Todas estas solicitudes fueron ejecutadas acorde a las instrucciones y enviadas al auditor quien avaló la renovación del permiso de la pista.
- La Sra. Carolina Herrera y la Ing. Ambiental Camila Ducuara atendieron a la feria internacional industrial de Bogotá con el fin de explorar, conocer y aprender un poco más de la innovación en la industria. En la visita lograron conocer diversos productores y proveedores de productos que podrían ser de gran utilidad en la plantación.

- **Otras Actividades**

- El día 13 de Julio, la Sra. Carolina Herrera, gerente de los fondos forestales y Pablo Jaramillo, investigación de mercado, atendieron a una conferencia organizada por la empresa SOAN laboratorios, en los que presentaron productos innovadores a base de caucho natural. En el lugar, se encontraban varios actores importantes del sector, incluidos productores, procesadores y demás. El objetivo principal de asistir fue el de buscar potenciales clientes del coagulo de caucho, así como conexiones clave que podrían ser de nuestro beneficio.
- Se llevó a cabo una extensiva revisión del inventario de repuestos de tractores en la plantación, esto con el fin de aclarar con que repuestos se contaba y definir cuales podían ser utilizados para hacer un cambio con Jhon Deere. El intercambio tiene como fin habilitar un tractor más para las labores de la plantación.

- **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde Julio hasta Septiembre de 2022.

- **Llamados a Capital y Desembolsos de Crédito**

Al respecto, se informa que Colfondos, inversionista principal del compartimento (93%) envía un comunicado el 26 de septiembre respecto del no aporte de recursos adicionales sobre el llamado capital realizado.

- **Valoración Septiembre 2022**

Presentación de la valoración realizada con corte septiembre de 2022.

- **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte septiembre de 2022.

#### **5.4.Extracto acta No. 061**

En Bogotá, siendo las 10 am del día 19 de enero del 2023, por medios virtuales a través de la plataforma ZOOM, se efectuó previa convocatoria llevada a cabo por el Sr. Rodrigo Mayorga, Representante Legal de NACOBENA S.A.S., Gestor Profesional del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y sus diversos Compartimentos.

- **Visita a Plantación y Actividades de los Fondos**

Se reporta la siguiente información:

- En el mes de octubre viajaron a la plantación, el Sr Rodrigo Mayorga, el Ing. Carlos Pérez y la Sra. Carolina Herrera, con el fin de verificar los avances y el estado de las actividades técnicas programadas para el periodo en cuestión.
- El 25 de Noviembre, a partir de las 2:00 pm, se realizó la fiesta de fin de año de la plantación, a la que asistieron los empleados y sus familias, y los vecinos de las fincas aledañas. Durante la fiesta, los protagonistas fueron los hijos de los empleados, los cuales recibieron regalos que fueron proporcionados por el proveedor del fertilizante MIP, quien se unió a la celebración apoyando la infancia y el futuro de nuestro país y así otorgarles una digna celebración para clausurar el año 2022.
- El personal médico del hospital del municipio de Santa Rosalía realizó una jornada de atención primaria en salud para el personal de la plantación, esta fue llevada a cabo en las instalaciones del Compartimento Caucho 3. Durante la jornada, el personal de la plantación recibió orientación médica general y odontológica, fueron remitidos a especialistas, y se les hizo entrega de medicamentos necesarios.
- El equipo del gestor realizó el respectivo acompañamiento y orientación al asesor del Banco DAVIVIENDA, quien visito la plantación para llevar a cabo las respectivas verificaciones.
- El equipo técnico y administrativo de la plantación llevo a cabo la campaña de censos del año 2022, con el fin de obtener los datos que indican el crecimiento de los árboles. Durante el censo, se consolido el protocolo que se debe llevar a cabo en próximas campañas, esto con el fin de disminuir el porcentaje de error y obtener datos confiables que permitan la toma de decisiones efectivas en cuanto al manejo técnico de todos los compartimentos.

- Durante la campaña de censos, se identificaron focos de comején que han avanzado rápidamente en árboles de los compartimentos 1, 5, y 8. Adicionalmente hay zonas invadidas por bachacos. Ambas plagas no se han controlado porque los compartimentos en mención no cuentan con recursos.
- El 11 de diciembre se llevó a cabo una ruta de recolección de residuos ordinarios en los compartimentos 6,8 y 12 (Caucho-Cacao). Una vez fueron recogidos los residuos, se transportaron hacia la bodega del gestor externo ubicado en la ciudad de Villavicencio y posteriormente trasladados al sitio de disposición final. El manejo, gestión y la adecuada disposición final de los residuos que se generan en la plantación, son acciones elementales de responsabilidad ambiental.

#### • **Revisión de Requerimientos y Compras del Periodo**

Revisión y reporte de compras realizadas en cada uno de los compartimentos desde octubre hasta Diciembre de 2022.

#### • **Valoración Diciembre 2022**


Presentación de la valoración realizada con corte Diciembre de 2022.

#### • **Estados Financieros**

Revisión de los balances de los Fondos Forestales con corte Diciembre de 2022.

### **4. RENTABILIDAD Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL FONDO**

#### **4.1 Evolución Valor del Fondo y Valor de la unidad**

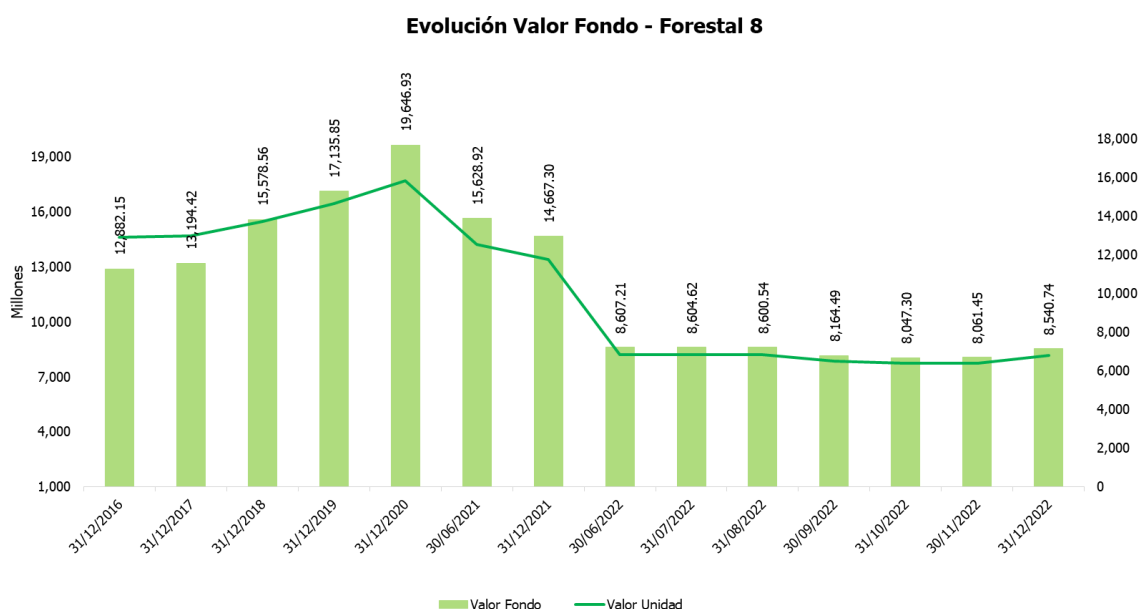

## 4.2 Rentabilidad

| CAUCHO 08                    | DIC/2022           |
|------------------------------|--------------------|
| Valor del Compartimento      | \$8,540,738,797.34 |
| Número de unidades           | 1,259,448.53       |
| Valor de la Unidad           | 6,781.33           |
| Rentabilidad Mensual (E.A)   | 97.39%             |
| Volatilidad Mensual          | 0.10%              |
| Rentabilidad Semestral (E.A) | -1.53%             |
| Volatilidad Semestral        | 5.75%              |
| Rentabilidad Anual (E.A)     | -42.28%            |
| Volatilidad Anual            | 17.06%             |

## 4.3 Composición por tipo de inversionista

Al 31 de diciembre de 2022, el Compartimento se encuentra conformado en su totalidad por Personas Jurídicas.

## 5. Estados de Situación Financiera del Fondo.

Anexo a la presente rendición de cuentas de remiten los estados de situación financiera a corte del mes de diciembre de 2022 con sus respectivas notas.

*“La información contenida en el presente documento se calcula con base en modelos financieros y estudios de mercado realizados por la Sociedad Administradora, los cuales están sujetos a diversos factores y variables, por lo que los valores, porcentajes y plazos presentados, pueden diferir del resultado final que se llegue a obtener y por lo tanto no pueden ser considerados como un compromiso por parte de la Sociedad Administradora.”*

*“La inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores de los valores emitidos por el Fondo de Capital Privado, en los términos del artículo 1.1.2.9. de la Resolución 400 de 2005, no implican certificación de la Superintendencia Financiera sobre la rentabilidad del Fondo o la Seguridad de sus inversiones. La Superintendencia*

**INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS**  
**FONDO DE CAPITAL PRIVADO VALOR FORESTAL**  
**COMPARTIMENTO 8**  
**SEGUNDO SEMESTRE 2022**



*Financiera de Colombia, advierte al potencial inversionista que el Fondo de Capital Privado es un producto de riesgo, por lo cual es necesario que, para tomar su decisión de inversión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión"*

*"Las obligaciones asumidas por Fiduciaria Central S.A. como sociedad administradora del Fondo de Capital Privado Valor Forestal y del gestor profesional son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión no son un depósito, ni generan para Fiduciaria Central S.A., o el gestor profesional las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el compartimento está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del compartimento, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante".*
